






Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	19					30 dic '19					06 ene '20					13 ene '20						
						X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
1		LSMT	20 días	lun 03/02/20	vie 28/02/20																						
2		Desmontar instalación existente	10 días	lun 03/02/20	vie 14/02/20																						
3		Montaje apoyos y conexionado	10 días	lun 17/02/20	vie 28/02/20																						
4		LSBT	95 días	lun 03/02/20	vie 12/06/20																						
5		Demolicion de aceras y asfalto	27 días	lun 03/02/20	mar 10/03/20																						
6		Instalacion de nuevo tubo y cableado	18 días	mié 11/03/20	vie 03/04/20																						
7		Reposicion de materiales en zanja	13 días	lun 06/04/20	mié 22/04/20																						
8		Reposicion de acera y asfalto	25 días	jue 23/04/20	mié 27/05/20																						
9		Acabados	12 días	jue 28/05/20	vie 12/06/20																						
10		CT	18 días	lun 03/02/20	mié 26/02/20																						
11		Instalación de nuevos componentes	18 días	lun 03/02/20	mié 26/02/20																						
12		FAROLAS	14 días	lun 15/06/20	jue 02/07/20																						
13		Instalacion de nuevo cableado	11 días	lun 15/06/20	lun 29/06/20																						
14		Reposicion de tapas y acabados	3 días	mar 30/06/20	jue 02/07/20																						
15		OBRA CIVIL	44 días	lun 03/02/20	jue 02/04/20																						
16		Excavación calle	6 días	lun 03/02/20	lun 10/02/20																						
17		Demolición acera y muro parque	3 días	mar 11/02/20	jue 13/02/20																						
18		Excavación pozo parque	4 días	vie 14/02/20	mié 19/02/20																						
19		Instalación conducciones agua residual	6 días	jue 20/02/20	jue 27/02/20																						
20		Reposición materiales en calle	5 días	vie 28/02/20	jue 05/03/20																						
21		Instalacion mallazo y encofrado	7 días	vie 06/03/20	lun 16/03/20																						
22		Vertido hormigón	2 días	mar 17/03/20	mié 18/03/20																						
23		Acabados calle y parque	11 días	jue 19/03/20	jue 02/04/20																						

Proyecto: Project Cabagua  
Fecha: lun 30/12/19

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso




Resumen del proyecto




Fecha límite



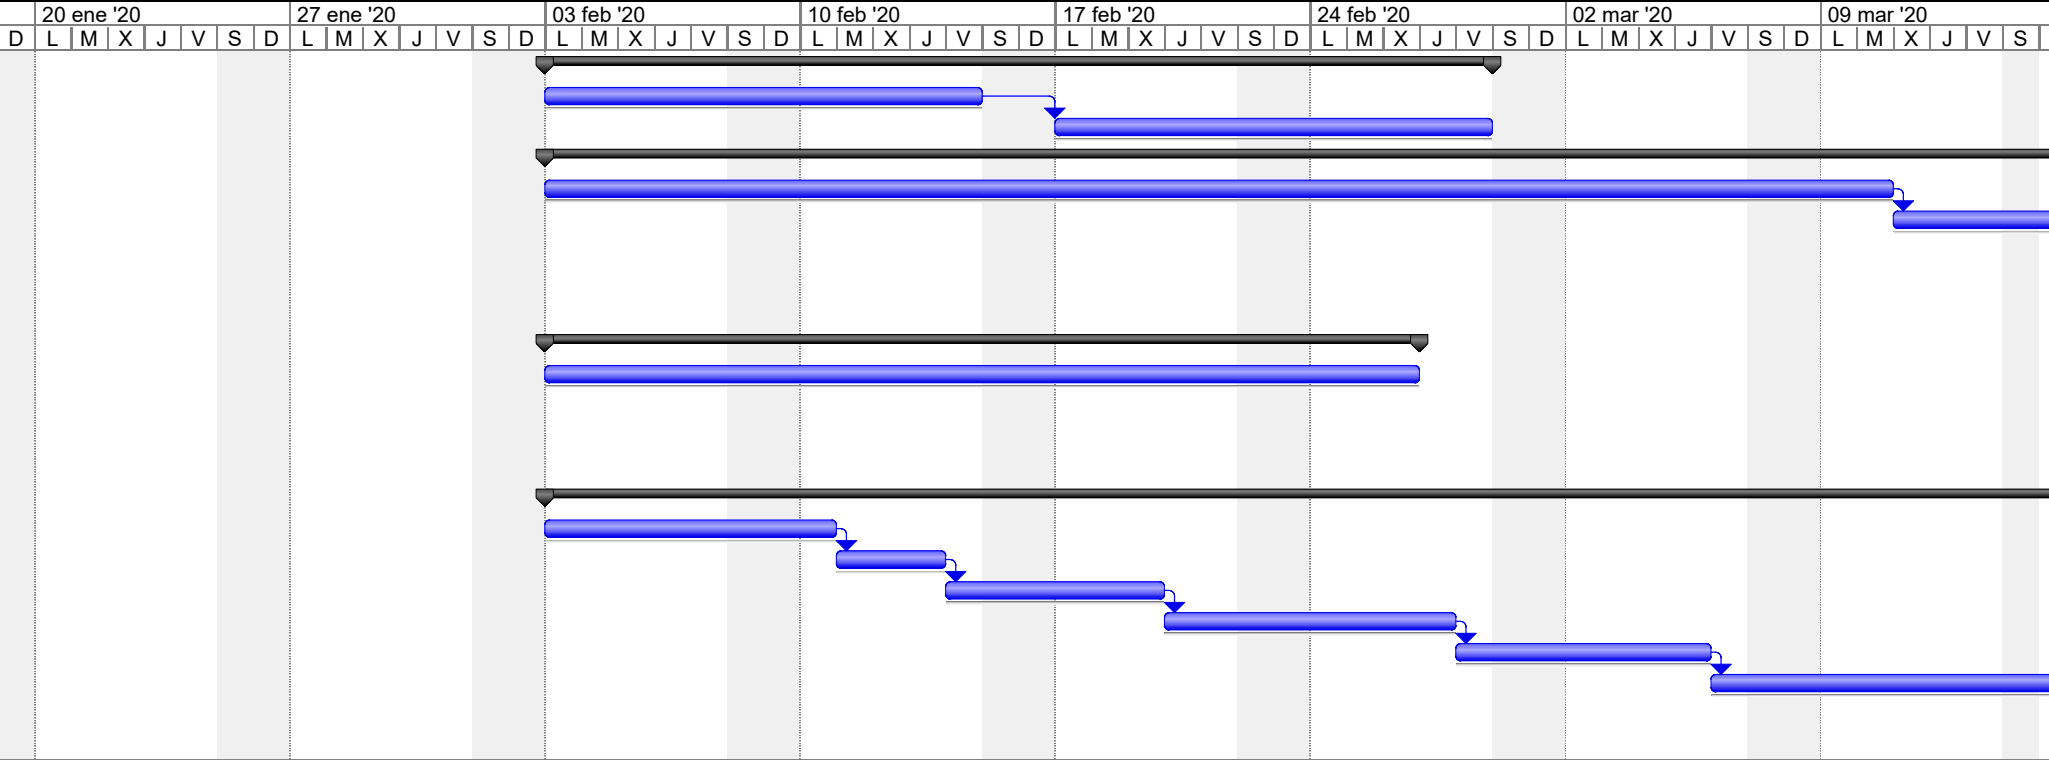

Proyecto: Project Cabagua Fecha: lun 30/12/19	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	



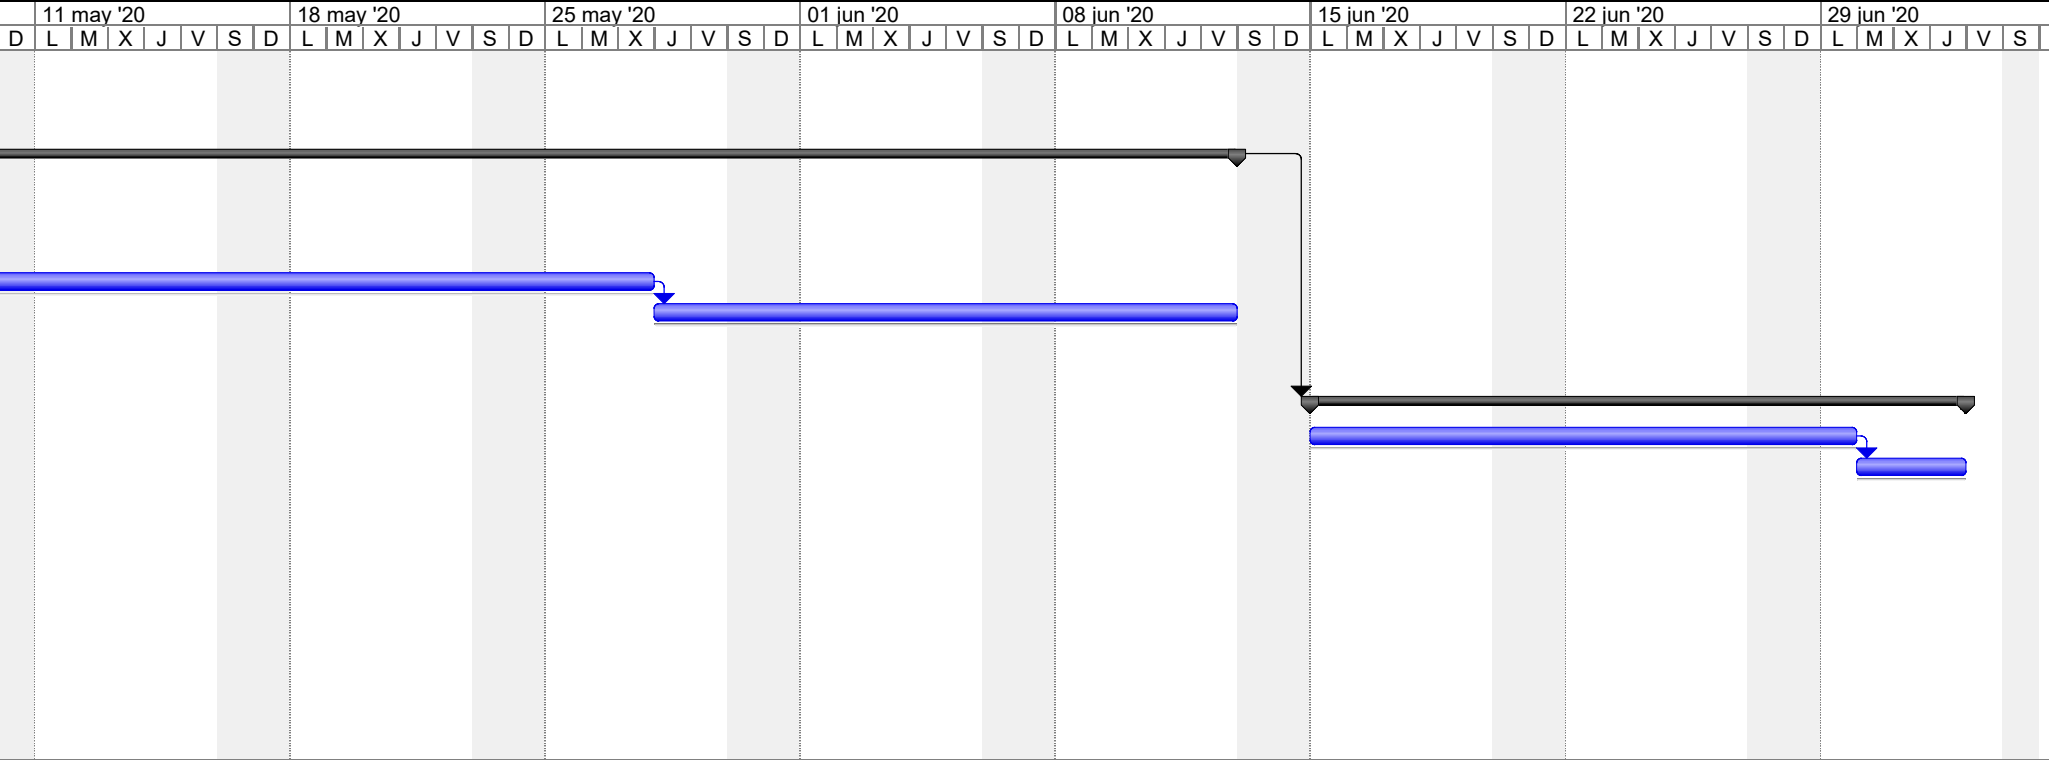

Proyecto: Project Cabagua Fecha: lun 30/12/19	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	
